The Kingsway, Swansea – Office Development
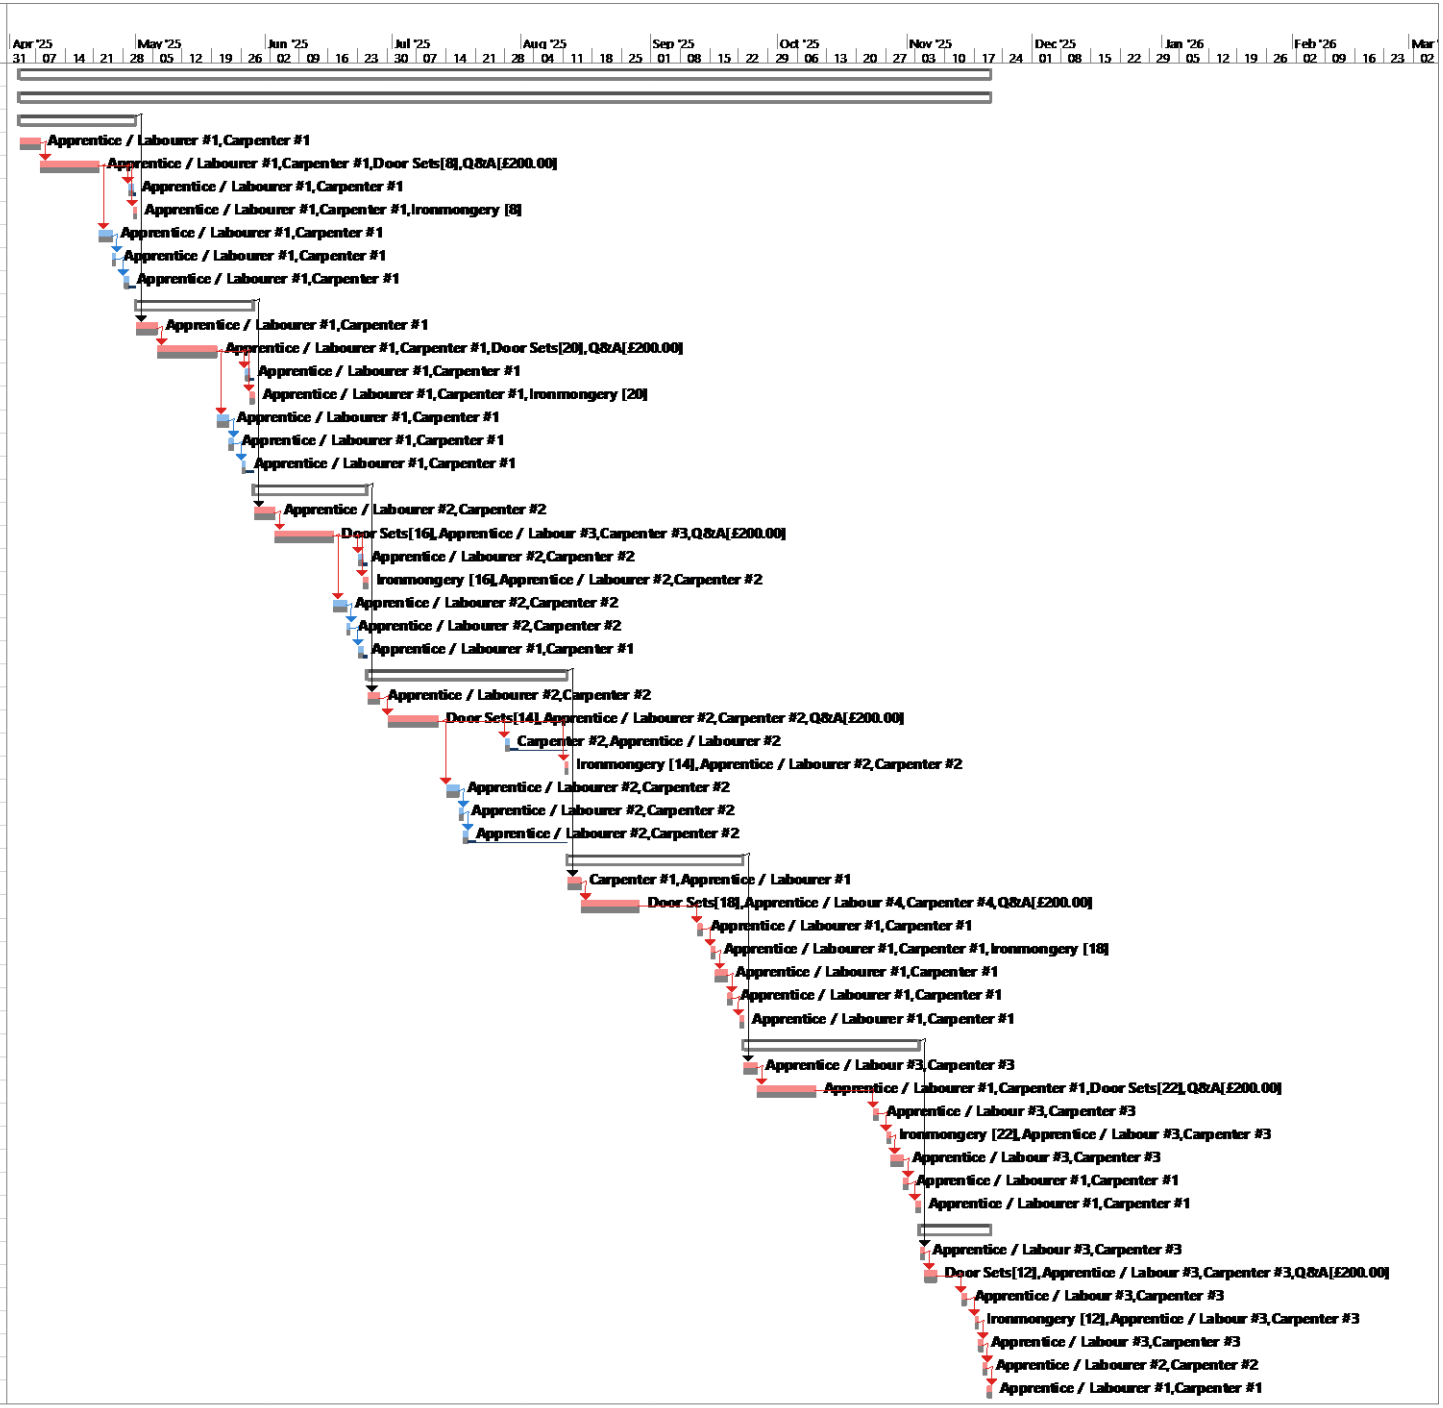
ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
37			**Internals**	**166 days**	**Thu 03/04/25**	**Thu 20/11/25**
38			**Carpentry**	**166 days**	**Thu 03/04/25**	**Thu 20/11/25**
39			**Basement (Upper)**	**20 days**	**Thu 03/04/25**	**Wed 30/04/25**
40			Window Cills	3 days	Thu 03/04/25	Mon 07/04/25
41			Door sets	10 days	Tue 08/04/25	Mon 21/04/25
42			Architraves	1 day	Tue 29/04/25	Tue 29/04/25
43			Ironmongery	1 day	Wed 30/04/25	Wed 30/04/25
44			Skirting	3 days	Tue 22/04/25	Thu 24/04/25
45			Stair Strings	1 day	Fri 25/04/25	Fri 25/04/25
46			FF&E	1 day	Mon 28/04/25	Mon 28/04/25
47			**Ground Floor**	**20 days**	**Thu 01/05/25**	**Wed 28/05/25**
48			Window Cills	3 days	Thu 01/05/25	Mon 05/05/25
49			Door Sets	10 days	Tue 06/05/25	Mon 19/05/25
50			Architraves	1 day	Tue 27/05/25	Tue 27/05/25
51			Ironmongery	1 day	Wed 28/05/25	Wed 28/05/25
52			Skirting	3 days	Tue 20/05/25	Thu 22/05/25
53			Stair Strings	1 day	Fri 23/05/25	Fri 23/05/25
54			FF&E	1 day	Mon 26/05/25	Mon 26/05/25
55			**First Floor**	**19 days**	**Thu 29/05/25**	**Tue 24/06/25**
56			Window Cills	3 days	Thu 29/05/25	Mon 02/06/25
57			Door Sets	10 days	Tue 03/06/25	Mon 16/06/25
58			Architraves	1 day	Mon 23/06/25	Mon 23/06/25
59			Ironmongery	1 day	Tue 24/06/25	Tue 24/06/25
60			Skirting	3 days	Tue 17/06/25	Thu 19/06/25
61			Stair Strings	1 day	Fri 20/06/25	Fri 20/06/25
62			FF&E	1 day	Mon 23/06/25	Mon 23/06/25
63			**Second Floor**	**34 days**	**Wed 25/06/25**	**Mon 11/08/25**
64			Window Cills	3 days	Wed 25/06/25	Fri 27/06/25
65			Door Sets	10 days	Mon 30/06/25	Fri 11/07/25
66			Architraves	1 day	Mon 28/07/25	Mon 28/07/25
67			Ironmongery	1 day	Mon 11/08/25	Mon 11/08/25
68			Skirting	3 days	Mon 14/07/25	Wed 16/07/25
69			Stair Strings	1 day	Thu 17/07/25	Thu 17/07/25
70			FF&E	1 day	Fri 18/07/25	Fri 18/07/25
71			**Third Floor**	**30 days**	**Tue 12/08/25**	**Mon 22/09/25**
72			Window Cill	3 days	Tue 12/08/25	Thu 14/08/25
73			Door Sets	10 days	Fri 15/08/25	Thu 28/08/25
74			Architraves	1 day	Fri 12/09/25	Fri 12/09/25
75			Ironmongery	1 day	Mon 15/09/25	Mon 15/09/25
76			Skirting	3 days	Tue 16/09/25	Thu 18/09/25
77			Stair Strings	1 day	Fri 19/09/25	Fri 19/09/25
78			FF&E	1 day	Mon 22/09/25	Mon 22/09/25
79			**Fourth Floor**	**30 days**	**Tue 23/09/25**	**Mon 03/11/25**
80			Window Cills	3 days	Tue 23/09/25	Thu 25/09/25
81			Door Sets	10 days	Fri 26/09/25	Thu 09/10/25
82			Architraves	1 day	Fri 24/10/25	Fri 24/10/25
83			Ironmongery	1 day	Mon 27/10/25	Mon 27/10/25
84			Skirting	3 days	Tue 28/10/25	Thu 30/10/25
85			Stair Strings	1 day	Fri 31/10/25	Fri 31/10/25
86			FF&E	1 day	Mon 03/11/25	Mon 03/11/25
87			**Fifth Floor**	**13 days**	**Tue 04/11/25**	**Thu 20/11/25**
88			Window Cills	1 day	Tue 04/11/25	Tue 04/11/25
89			Door sets	3 days	Wed 05/11/25	Fri 07/11/25
90			Architraves	1 day	Fri 14/11/25	Fri 14/11/25
91			Ironmongery	1 day	Mon 17/11/25	Mon 17/11/25
92			Skirting	1 day	Tue 18/11/25	Tue 18/11/25
93			Stair Strings	1 day	Wed 19/11/25	Wed 19/11/25
94			FF&E	1 day	Thu 20/11/25	Thu 20/11/25
